



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba



Risk Management Plan

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.1
Data	07/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
06/11/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP
07/12/2025	1.1	Ulteriori Correzioni	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Introduzione	4
2 Risk Management Approach	4
2.1 Metodologia	4
2.2 Ruoli e responsabilità	4
2.3 Budget e schedule	4
2.4 Categorie di rischi	4
2.5 Probabilità e impatto dei rischi	5
3 Risk Breakdown Structure	6
4 Opportunità	7
5 Risk Register	8



1 Introduzione

Il presente documento ha l'obiettivo di esaminare in dettaglio i potenziali rischi negativi associati al progetto. Questi rischi saranno sistematicamente elencati e aggiornati all'interno del registro dei rischi. Questo approccio permetterà di anticipare e mitigare eventuali problemi, garantendo una migliore pianificazione e successo del progetto.

2 Risk Management Approach

2.1 Metodologia

Nel corso di questo progetto, la gestione dei rischi sarà effettuata mediante l'individuazione e l'elencazione dei potenziali rischi. L'identificazione avverrà all'inizio del progetto e sarà ripetuta quando necessario. Inoltre, ciascun rischio sarà distintamente identificato e descritto nell'apposito *Risk Register* sotto forma di foglio di lavoro.

2.2 Ruoli e responsabilità

I ruoli e le responsabilità saranno gestiti dai due *Project Managers*, che si occuperanno di redigere questo documento e aggiornare il *Risk Register* con i nuovi rischi identificati.

2.3 Budget e schedule

La gestione dei rischi comprenderà il 15% del tempo totale concesso ai *Project Managers* per il progetto. Tale budget, espresso sia in termini di ore che in termini economici, coprirà l'intera durata del progetto, dall'inizio alla fine.

2.4 Categorie di rischi

Le categorie di rischi utilizzate sono:

- **Tecnologie:** rischi associati all'hardware e al software selezionati per l'implementazione.
- **Persone:** rischi riguardanti i singoli membri del team e gli stakeholder.
- **Stime di progetto:** rischi relativi alle previsioni di budget e tempistiche del progetto.



- **Organizzativi:** rischi correlati direttamente alle attività dei *Project Manager*.
- **Requisiti:** rischi inerenti ai requisiti e all'ambito del progetto.

I rischi sono descritti da:

- **ID:** identificativo univoco del rischio.
- **Rank:** priorità del rischio, data dalla moltiplicazione tra probabilità e impatto. Valori più grandi rappresentano rischi a priorità più alta.
- **Nome**
- **Descrizione**
- **Categoria**
- **Causa:** causa che ha originato il rischio.
- **Trigger:** segnali di presenza del rischio.
- **Prevenzione:** piano per prevenire che il rischio si verifichi, riducendo la probabilità.
- **Contingenza:** piano per gestire il rischio una volta che si è verificato e ridurre il suo impatto.
- **Preferenza:** preferenza tra prevenzione e contingenza e relativa motivazione.
- **Probabilità**
- **Impatto**
- **Risk Owner**

2.5 Probabilità e impatto dei rischi

La probabilità che ogni rischio si verifichi è stata individuata attraverso i seguenti valori:


- **Bassa [L]:** minore del 30%.
- **Media [M]:** minore del 70%.
- **Alta [H]:** maggiore del 70%.

L'impatto sul progetto può essere di diversi tipi:



- **Tollerabile [TOL] (minore del 30%):** i rischi tollerabili non danneggiano in modo significativo il progetto, hanno un impatto lieve e prevedono una rapida risoluzione.
- **Medio [MD] (minore del 70%):** i rischi hanno un grande impatto sul progetto, causando un danneggiamento significativo e portando a rallentamenti o aumenti di costi.
- **Catastrofico [CAT] (maggiore del 70%):** i rischi catastrofici hanno un impatto molto esteso e di difficile risoluzione, danneggiando in modo significativo il progetto. Rischi di questo tipo potrebbero portare a un fallimento del progetto o a un estremo ritardo.

3 Risk Breakdown Structure

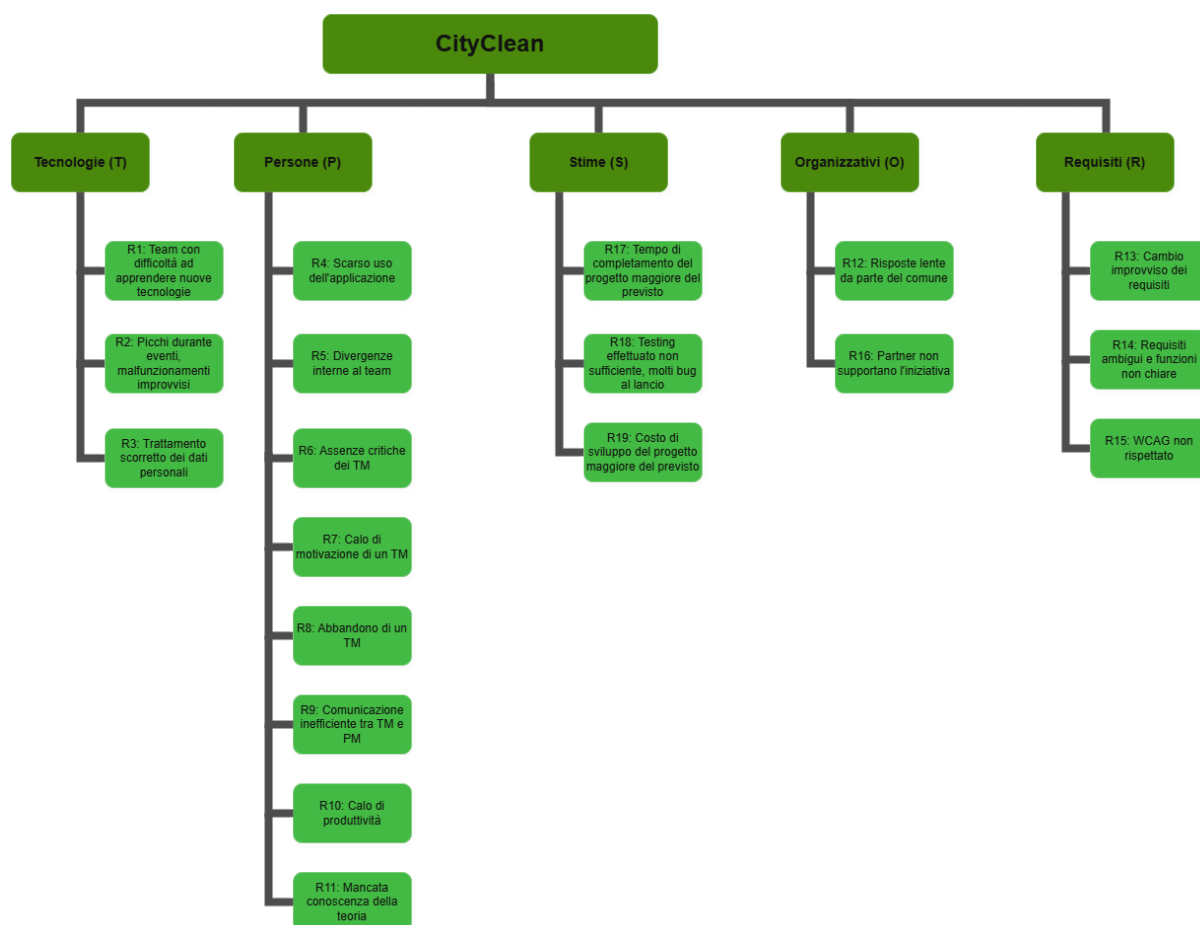



4 Opportunità

Il progetto *CityClean* non rappresenta soltanto una sfida sul piano tecnico e organizzativo, ma offre anche un insieme significativo di opportunità per il team di sviluppo, per il Comune di Salerno e per l'intera comunità coinvolta. La realizzazione di una piattaforma digitale gamificata, capace di integrare funzionalità di mappatura interattiva, analisi dei dati ambientali e strumenti di partecipazione civica, consente al gruppo di lavorare in un contesto altamente innovativo e in linea con le necessità attuali di sostenibilità urbana.

L'integrazione di tecnologie emergenti, come algoritmi di Intelligenza Artificiale per la previsione delle aree critiche e la generazione di percorsi ottimizzati, offre ai membri del team l'opportunità di ampliare competenze avanzate in ambiti di forte attualità. Allo stesso modo, la progettazione di meccaniche di gamification e di un'interfaccia mobile accessibile permette agli sviluppatori di sperimentare e consolidare conoscenze legate all'esperienza utente (UX), alla progettazione partecipativa e allo sviluppo mobile cross-platform. Questo processo contribuisce a una crescita professionale e creativa del team, promuovendo un ambiente di apprendimento continuo.

Dal punto di vista relazionale e istituzionale, *CityClean* apre nuove prospettive di collaborazione con enti pubblici, associazioni ecologiche e partner commerciali locali. Il coinvolgimento attivo del Comune di Salerno nella validazione delle funzionalità e nella condivisione dei dati ambientali rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare il dialogo tra studenti, pubblica amministrazione e cittadini. Tali sinergie possono agevolare la nascita di future iniziative orientate alla smart city e alla sostenibilità ambientale, ampliando il network professionale dei membri del team.

Inoltre, la raccolta e l'analisi dei dati territoriali e comportamentali generati dagli utenti della piattaforma fornirà informazioni preziose per la pianificazione di interventi ecologici mirati e per la definizione di politiche pubbliche basate su evidenze empiriche. In questo senso, *CityClean* si configura non solo come uno strumento operativo, ma anche come un supporto strategico per il miglioramento continuo della gestione ambientale urbana.

Infine, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità promossi dalle agende locali e nazionali, *CityClean* rafforza la responsabilità sociale del progetto, incrementa la visibilità del team e favorisce l'adozione di pratiche ecologiche da parte della cittadinanza. Questo può tradursi in una maggiore partecipazione civica, in nuove opportunità di finanziamento per futuri sviluppi e in un concreto vantaggio competitivo nel panorama delle soluzioni digitali orientate all'ambiente.



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

5 Risk Register

Per motivi di leggibilità, il *Risk Register* è stato redatto sotto forma di foglio di lavoro e consegnato come file allegato al presente documento. Il registro contiene l'elenco completo dei rischi identificati per il progetto *CityClean*, con le relative informazioni su probabilità, impatto, rank, prevenzione, contigenza e stato di ciascun rischio.

Per visionare il registro completo, si rimanda al seguente file allegato:

C06_Risk_Register.xlsx

Tale file costituisce parte integrante del presente Risk Management Plan e viene aggiornato periodicamente dai Project Manager nel corso dello sviluppo del progetto.
