



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba



Project Budget

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.1
Data	05/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
16/11/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP
05/12/2025	1.1	Ulteriori Correzioni	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – *Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba*

Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Introduzione	4
2 I Milestone	4
3 II Milestone	8
4 Cost Baseline	10
5 Financial Exposure	12
6 Riferimenti	13



1 Introduzione

Il Project Budget è un documento esplicativo nel quale vengono fornite tutte le informazioni riguardo i Work Package individuati per lo sviluppo dell'intero progetto. L'intero sviluppo è stato suddiviso in due milestone principali:

- **I Milestone:** Sviluppo di un MVP.
- **II Milestone:** Sviluppo del prodotto finale.

2 I Milestone

Work Package 1 - RAD

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Elicitation	Fase di Elicitation	90	15	1.350
Analysis	Fase di Analisi dei Requisiti	100	15	1.500
Revisioni	Revisione artefatti	30	15	450
Meetings	Meeting Settimanali	15	15	225
SUBTOTALE (€)				3.525



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
 Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Work Package 2 - SDD

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Introduzione	Design Goal e Trade-Offs	30	15	450
Decomposizione in Sottosistemi	Individuazione dei sottosistemi	95	15	1.425
Revisioni	Revisione artefatti	30	15	450
Meetings	Meeting Settimanali	15	15	225
SUBTOTALE (€)				2.550

Work Package 3 - ODD

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Introduzione	Introduzione ODD	30	15	450
Packages	Stesura dei Packages	40	15	600
Class Interfaces	Stesura delle Class Interfaces	40	15	600
Revisioni	Revisione artefatti	30	15	450
Meetings	Meeting Settimanali	15	15	225
SUBTOTALE (€)				2.325



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
 Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Work Package 4 - Testing Pre Implementazione

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Test Plan	Stesura TP	45	15	675
Test Case Specification	Stesura TCS	20	15	300
Revisioni	Revisione artefatti	30	15	450
Meetings	Meeting Settimanali	15	15	225
SUBTOTALE (€)				1.650

Work Package 5 - Implementazione

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Database	Implementazione Database	80	15	1.200
Backend	Implementazione Backend	100	15	1.200
Frontend	Implementazione Frontend	60	15	975
SUBTOTALE (€)				3.375



Work Package 6 - Testing

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Test di Unità	Test di Unità	30	15	600
Test di Sistema	Test di Sistema	30	15	600
Test Incident Report	Test Incident Report	30	15	600
Test Summary Report	Test Summary Report	10	15	150
Revisione	Revisione Artefatti	10	15	150
SUBTOTALE (€)				1.650

Work Package 7 - Project Management

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Project Management Prototipo	Monitoraggio MVP	180	20	3.600
SUBTOTALE (€)				3.600



3 II Milestone

Per la II Milestone di progetto si presenta solamente un sommario dei singoli Work-Package essendo che durante questa fase non si prevede una suddivisione specifica dei vari Work Package essendo che le uniche cose previste sono raffinazioni dei documenti stilati in precedenza (durante la I milestone) e il completamento dell'applicazione con rilascio finale del prodotto sul mercato.

Resource Name	Description	Ore	Fee (€)	Totale (€)
Seconda Milestone TM	Seconda Milestone TM	1160	15	17.400
Seconda Milestone PM	Seconda Milestone PM	240	20	4.800
SUBTOTALE (€)				22.200




Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

SUMMARY	
RAD	3.525 euro
SDD	2.250 euro
TP/TCS	1.650 euro
ODD	2.325 euro
Implementazione	3.375 euro
Testing	1.650 euro
Project Management	3.600 euro
Rilascio Finale	22.200 euro

Total cost: 40.875 euro



4 Cost Baseline

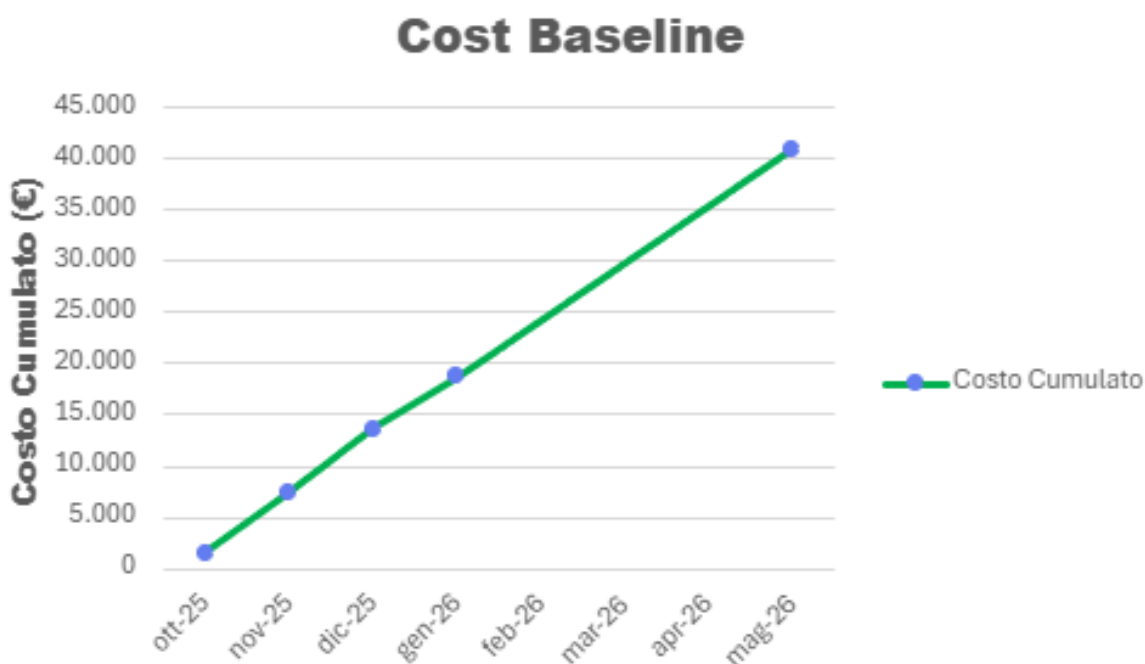

La Cost Baseline rappresenta la pianificazione finanziaria dettagliata del progetto, suddivisa in attività e milestone, e consente di monitorare i costi durante l'intero ciclo di vita del progetto. Ad **Ottobre**, vediamo un costo relativamente basso di €1.575, che suggerisce un avvio graduale del progetto, con **attività preliminari** come la Requirements Analysis Document (RAD) che inizia a prendere forma. A **Novembre**, il costo aumenta di €5.925, indicando una forte progressione nelle **attività di progettazione e sviluppo**, come il Software Design Document (SDD), e l'Object Design Document (ODD). **Dicembre** continua a dare un aumento nei costi complessivi, con l'aggiunta di €6.150, il che è coerente con l'intensificarsi delle attività di sviluppo e implementazione, oltre al testing. I costi nei due mesi di Novembre e Dicembre sono abbastanza bilanciati, andando a dividere il lavoro principale per la consegna dell'MVP in questi due mesi, oltre all'inizio delle attività a metà Ottobre. Il costo per **Gennaio** è di €5.025, che rappresenta la fase finale e la consegna dell'MVP, e coincide con **l'inizio della seconda milestone**, il rilascio del **prodotto finale**. Questo aumento sostanziale riflette tutte le attività necessarie per portare il progetto a termine. Questo è un periodo critico in cui il team si concentra sulla rifinitura del prodotto, sulla risoluzione degli ultimi problemi e sulla preparazione per il lancio.



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno

Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Abbiamo preferito lasciare i costi accumulati fino a Maggio nella Cost Baseline perchè non abbiamo ancora designato i costi e le attività, tramite WBS, per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio, mese finale per la consegna del prodotto.


I costi dei rischi, pari a **€6.131**, non vengono calcolati nella Baseline.



5 Financial Exposure

La Financial Exposure analizza l'impatto economico del progetto, evidenziando l'allocatione dei fondi rispetto ai costi sostenuti e pianificati. Questo parametro è fondamentale per valutare i rischi finanziari e garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficiente. Infatti all'interno di quest'analisi sono inseriti anche i costi relativi alle contingenze, quindi alla gestione dei rischi che potrebbero incorrere durante tutta la durata del progetto.

MESE	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	mag-26
COST	1.575	5.925	6.150	5.025	22.200
TOTAL SPENT	1.575	7.500	13.650	18.675	40.875
TRANSFERS	15.000	15.000	15.000	15.000	0
TOTAL FUNDING	15.000	30.000	45.000	60.000	60.000
CASH IN ACCOUNT	13.425	22.500	31.350	41.325	19.125

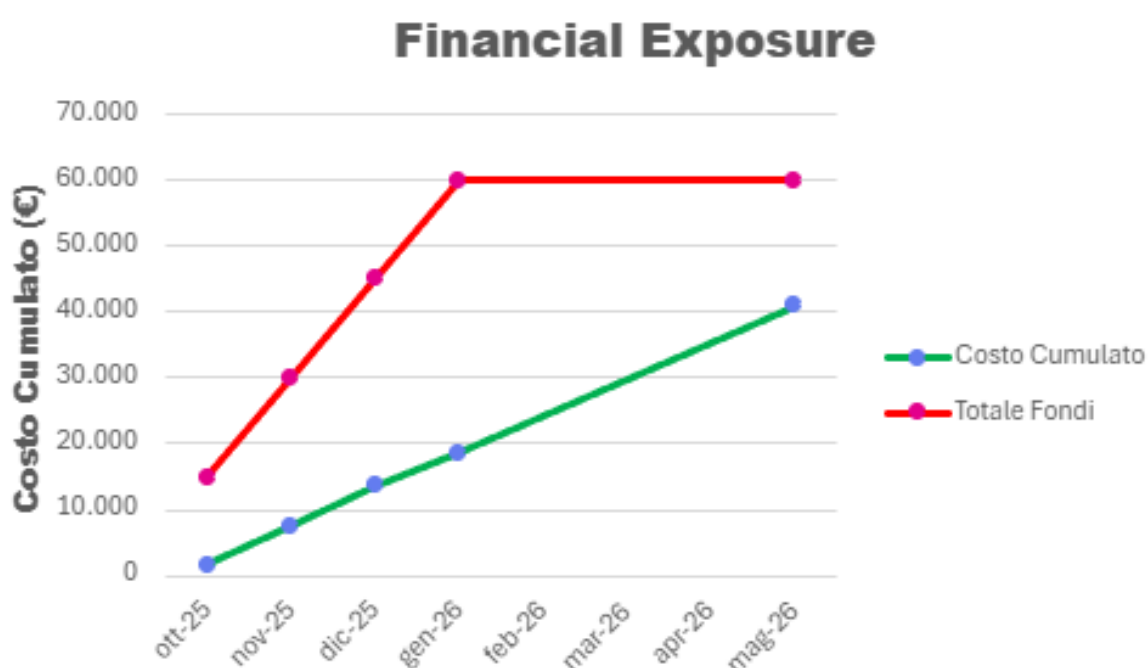



Il progetto raggiungerà la sua prima milestone con il rilascio del prototipo il 14 Gennaio 2026. I trasferimenti di fondi di €45.000 ad Ottobre, Novembre e Dicembre forniscono una solida base finanziaria per coprire i costi iniziali e accumulare una riserva di liquidità. La seconda milestone coincide con il rilascio del prodotto finale entro il 13/05/2026. Per questa ragione, da Febbraio 2026 a Maggio 2026, si verificherà un significativo aumento dei costi del personale a €22.200, riflettendo l'impegno a tempo pieno delle risorse sul progetto. Questo aumento è stato anticipato e pianificato, facendo versare al nostro cliente una somma fissa di denaro pari a €15.000, portando il totale dei fondi a €60,000 (budget massimo previsto). Non ci sono pagamenti specifici ai fornitori, perché i costi del progetto sono principalmente legati al personale interno. Altri costi aggiuntivi sono previsti nella fase di manutenzione post-rilascio. Inoltre, non sono stati considerati ritardi nei pagamenti da part del cliente poiché il progetto non genera entrate durante la fase di sviluppo. Gli stipendi saranno pagati regolarmente alla fine di ogni mese, costituendo un flusso di uscite costante e prevedibile nella pianificazione finanziaria. Al termine di Maggio 2026, il conto del progetto mostra un saldo di €19.125 , a dimostrazione che i fondi trasferiti sono sufficienti a coprire i costi del personale fino al completamento del progetto. È essenziale continuare a monitorare il flusso di cassa per assicurarsi che i fondi siano gestiti in modo efficiente e che il progetto non subisca interruzioni a causa di carenze di liquidità. Inoltre, sono stati lasciati fondi nel conto del progetto per prevenire i costi degli eventuali rischi che possono verificarsi, non andando a minare nella riuscita del progetto. Infatti, avendo stimato un 15% del totale dei costi da aggiungere per la gestione dei rischi, previsti e non previsti, abbiamo un margine abbondante per evitare rallentamenti del progetto ed evitare al cliente di dover fornire più soldi di quanto previsto. Inoltre, nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile potrebbero esserci nuove entrate minori per continuare ad avere un flusso di cassa attivo.

6 Riferimenti

Per ulteriori dettagli su risorse allocate, e gestione finanziarie si rimanda ai seguenti documenti:

- **C06 BC:** Analisi di business ed obiettivi di business imposti dal cliente.
- **C06 FA:** Analisi finanziarie del prodotto in termini di risorse.
