

ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
0			0	CityClean	65 giorni	gio 16/10/25	mer 14/01/26						
1			1	RAD	22 giorni	gio 16/10/25	ven 14/11/25						
2			1.1	Meeting	22 giorni	gio 16/10/25	ven 14/11/25						
3			1.2	Elicitation	6,75 giorni	gio 16/10/25	ven 24/10/25						
4			1.2.1	Introduzione	10 h.	ven 17/10/25	lun 20/10/25		Domenico di Caprio				
5			1.2.2	Sistema Corrente	20 h.	ven 17/10/25	ven 24/10/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi				
6			1.2.3	Sistema Proposto	6,25 giorni	gio 16/10/25	ven 24/10/25						
7			1.2.3.1	Panoramica	5 h.	gio 16/10/25	gio 16/10/25		Pio Cascone				
8			1.2.3.2	Activity Diagram	10 h.	gio 16/10/25	ven 17/10/25	7	Pio Cascone;Paolo Maria Siconolfi				
9			1.2.3.3	Requisiti Funzionali	15 h.	ven 17/10/25	mar 21/10/25	7;8;11	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Dome di Caprio;Paolo				
10			1.2.3.4	Requisiti non funzionali	10 h.	mar 21/10/25	mer 22/10/25	9;11	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Dome di Caprio;Paolo				

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Page 1

ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
11			1.2.3.5	Scenari	10 h.	gio 16/10/25	ven 17/10/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
12			1.2.3.6	Use Case	10 h.	gio 23/10/25	ven 24/10/25	9;10;11	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
13			1.3	Analysis	12,5 giorni	ven 24/10/25	mer 12/11/25						
14			1.3.1	Modello ad oggetti	5,63 giorni	ven 24/10/25	lun 03/11/25						
15			1.3.1.1	Individuazione Oggetti	15 h.	ven 24/10/25	mar 28/10/25	3	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
16			1.3.1.2	Class Diagram	30 h.	mar 28/10/25	lun 03/11/25	15	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
17			1.3.2	Modello Dinamico	6,88 giorni	lun 03/11/25	mer 12/11/25						
18			1.3.2.1	Sequence Diagram	15 h.	lun 03/11/25	mer 05/11/25	14	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				

Project: CityClean

Date: sab 13/12/25

Task



Inactive Summary



External Tasks



Split



Manual Task



External Milestone



Milestone



Duration-only



Deadline



Summary



Manual Summary Rollup



Critical



Project Summary



Manual Summary



Critical Split



Inactive Task



Start-only



Progress



Inactive Milestone



Finish-only



Manual Progress



ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025 08 11 14
19			1.3.2.2	StateChart DDiagram	30 h.	mer 05/11/25	lun 10/11/25	14;18	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo	
20			1.3.2.3	MockUp	10 h.	mar 11/11/25	mer 12/11/25	14;18;19	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Paolo Maria Siconolfi	
21			1.4	Revision	2 giorni	mer 12/11/25	ven 14/11/25	3;13		
22			1.4.1	Revisione Architettura	10 h.	gio 13/11/25	ven 14/11/25		Domenico di Caprio;Pio Cascone	
23			1.4.2	Revisione Struttura	10 h.	mer 12/11/25	gio 13/11/25		Domenico di Caprio;Pio Cascone	
24			1.4.3	Matrice di Tracciabilità	10 h.	mer 12/11/25	gio 13/11/25		Domenico di Caprio;Paolo Maria Siconolfi	
25			1.4.4	Consegna	0 giorni	mer 12/11/25	mer 12/11/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo	
26			2	SDD	10 giorni	ven 14/11/25	gio 27/11/25	1		
27			2.1	Meeting	10 giorni	ven 14/11/25	gio 27/11/25			
28			2.2	Introduzione	2 giorni	ven 14/11/25	lun 17/11/25			

Project: CityClean

Date: sab 13/12/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone













Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only















External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress















ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
44			2.4.3	Matrice di Tracciabilità	1 giorno	gio 27/11/25	gio 27/11/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Pio Cascone				
45			2.4.4	Consegna	0 giorni	gio 27/11/25	gio 27/11/25		Domenico di Caprio;Paolo Maria Siconolfi;Pio Cascone;Amanda Pia Caterina Robertazzi				
46			3	ODD	9 giorni	ven 28/11/25	mer 10/12/25	26					
47			3.1	Meeting									
48			3.2	Introduzione	2 giorni	ven 28/11/25	lun 01/12/25						
49			3.2.1	Componenti Off-The-Shelfs	1 giorno	ven 28/11/25	ven 28/11/25		Domenico di Caprio;Pio Cascone				
50			3.2.2	Design Patterns	1 giorno	lun 01/12/25	lun 01/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Dome di Caprio;Paolo				
51			3.3	Packages	4 giorni	ven 28/11/25	mer 03/12/25						

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone













Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only















External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress















ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
52			3.3.1	Stesura dei Packages	2 giorni	mar 02/12/25	mer 03/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
53			3.4	Class Interface	1,25 giorni	gio 04/12/25	ven 05/12/25						
54			3.4.1	Stesura delle classi per Packages	1,25 giorni	gio 04/12/25	ven 05/12/25	52	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
55			3.5	Revision	3 giorni	lun 08/12/25	mer 10/12/25						
56			3.5.1	Revisione architettura	1 giorno	lun 08/12/25	lun 08/12/25		Pio Cascone;Amanda Pia Caterina Robertazzi				
57			3.5.2	Revisione struttura	1 giorno	mar 09/12/25	mar 09/12/25		Pio Cascone;Amanda Pia Caterina Robertazzi				
58			3.5.3	Matrice di tracciabilità	1 giorno	mer 10/12/25	mer 10/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Pio Cascone				

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Page 6

ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
59			3.5.4	Consegna	0 giorni	mer 10/12/25	mer 10/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
60			4	TP - TCS	8 giorni	gio 11/12/25	lun 22/12/25	46					
61			4.1	Meeting	8 giorni	gio 11/12/25	lun 22/12/25						
62			4.2	Test Plan	2 giorni	gio 11/12/25	ven 12/12/25						
63			4.2.1	Introduzione	1 giorno	gio 11/12/25	gio 11/12/25		Paolo Maria Siconolfi				
64			4.2.2	Panoramica del Sistema	1 giorno	gio 11/12/25	gio 11/12/25		Domenico di Caprio				
65			4.2.3	Relazione Documenti	1 giorno	gio 11/12/25	gio 11/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi				
66			4.2.4	Approccio	1 giorno	gio 11/12/25	gio 11/12/25		Paolo Maria Siconolfi				
67			4.2.5	Pass/Fail Criteria	1 giorno	gio 11/12/25	gio 11/12/25		Domenico di Caprio				
68			4.2.6	Features da Testare	1 giorno	gio 11/12/25	gio 11/12/25		Pio Cascone				
69			4.2.7	Sospensione e Ripristino	1 giorno	ven 12/12/25	ven 12/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi				
70			4.2.8	Test Deliverables	1 giorno	ven 12/12/25	ven 12/12/25		Pio Cascone				

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Page 7

ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
71			4.2.9	Materiale di Testing	1 giorno	ven 12/12/25	ven 12/12/25		Paolo Maria Siconolfi				
72			4.2.10	Responsabilità	1 giorno	ven 12/12/25	ven 12/12/25		Domenico di Caprio				
73			4.2.11	Stesura Test Cases	1 giorno	ven 12/12/25	ven 12/12/25	68	Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
74			4.3	Test Case Specification	1 giorno	lun 15/12/25	lun 15/12/25	62					
75			4.3.1	Identificazione e stesura casi di test	1 giorno	lun 15/12/25	lun 15/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
76			4.4	Revision	3 giorni	mar 16/12/25	gio 18/12/25						
77			4.4.1	Revisione Architettura	1 giorno	mar 16/12/25	mar 16/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Paolo Maria Siconolfi				
78			4.4.2	Revisione Struttura	1 giorno	mer 17/12/25	mer 17/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Paolo Maria Siconolfi				

Project: CityClean

Date: sab 13/12/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone















Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only















External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress















ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
79			4.4.3	Matrice di tracciabilità	1 giorno	gio 18/12/25	gio 18/12/25		Paolo Maria Siconolfi;Amanda Pia Caterina Robertazzi				
80			4.4.4	Consegna	0 giorni	gio 18/12/25	gio 18/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
81			5	Implementazione	12 giorni	mar 23/12/25	mer 07/01/26	60					
82			5.1	Database	5 giorni	mar 23/12/25	lun 29/12/25		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
83			5.2	Backend	5 giorni	mar 30/12/25	lun 05/01/26		Paolo Maria Siconolfi;Pio Cascone				
84			5.3	Frontend	7 giorni	mar 30/12/25	mer 07/01/26		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
85			6	Testing	5 giorni	mer 07/01/26	mar 13/01/26	81					
86			6.1	Test di Unità	2 giorni	mer 07/01/26	mar 13/01/26		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress


Page 9

ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025	08	11	14
87			6.2	Test di Sistema	1 giorno	gio 08/01/26	gio 08/01/26		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
88			6.3	Test Incident Report	1 giorno	ven 09/01/26	ven 09/01/26		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
89			6.4	Test Summary Report	1 giorno	lun 12/01/26	lun 12/01/26		Amanda Pia Caterina Robertazzi;Domenico di Caprio;Paolo				
90			6.5	Revisione	1 giorno	mar 13/01/26	mar 13/01/26		Domenico di Caprio;Paolo Maria Siconolfi				
91			7	Consegna	0 giorni	mer 14/01/26	mer 14/01/26	85					
92			8	ManagementMVP	65 giorni	gio 16/10/25	mer 14/01/26						
93			8.1	Management RAD	22 giorni	gio 16/10/25	ven 14/11/25		Antonio Ferrentino				
94			8.2	Management SDD	9 giorni	lun 17/11/25	gio 27/11/25	93	Antonio Ferrentino				
95			8.3	Management ODD	9 giorni	ven 28/11/25	mer 10/12/25	94	Antonio Ferrentino				
96			8.4	Management TP e TCS	8 giorni	gio 11/12/25	lun 22/12/25	95	Antonio Ferrentino				

Project: CityClean Date: sab 13/12/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	


ID		Modalità attività	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	025 08 11 14
97			8.5	Management Implementazione	12 giorni	mar 23/12/25	mer 07/01/26	96	Antonio Ferrentino	
98			8.6	Management Testing	5 giorni	gio 08/01/26	mer 14/01/26	97	Antonio Ferrentino	

Project: CityClean Date: sab 13/12/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

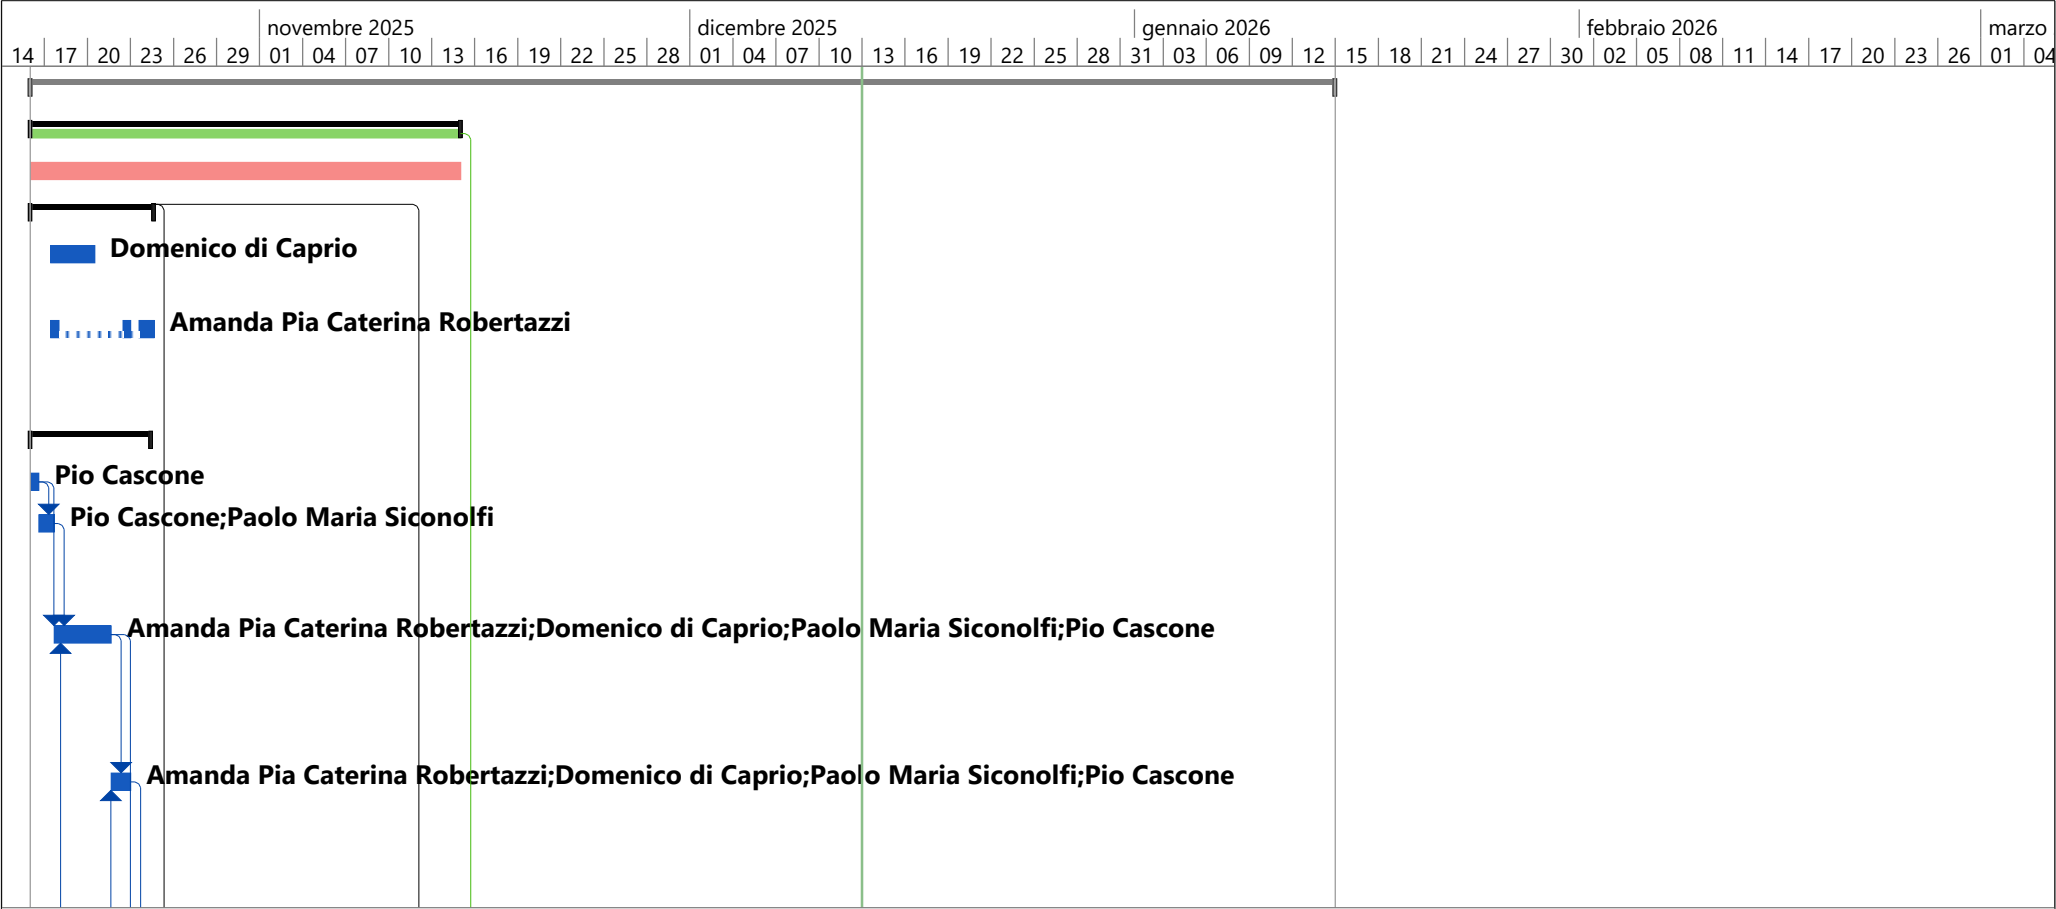


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

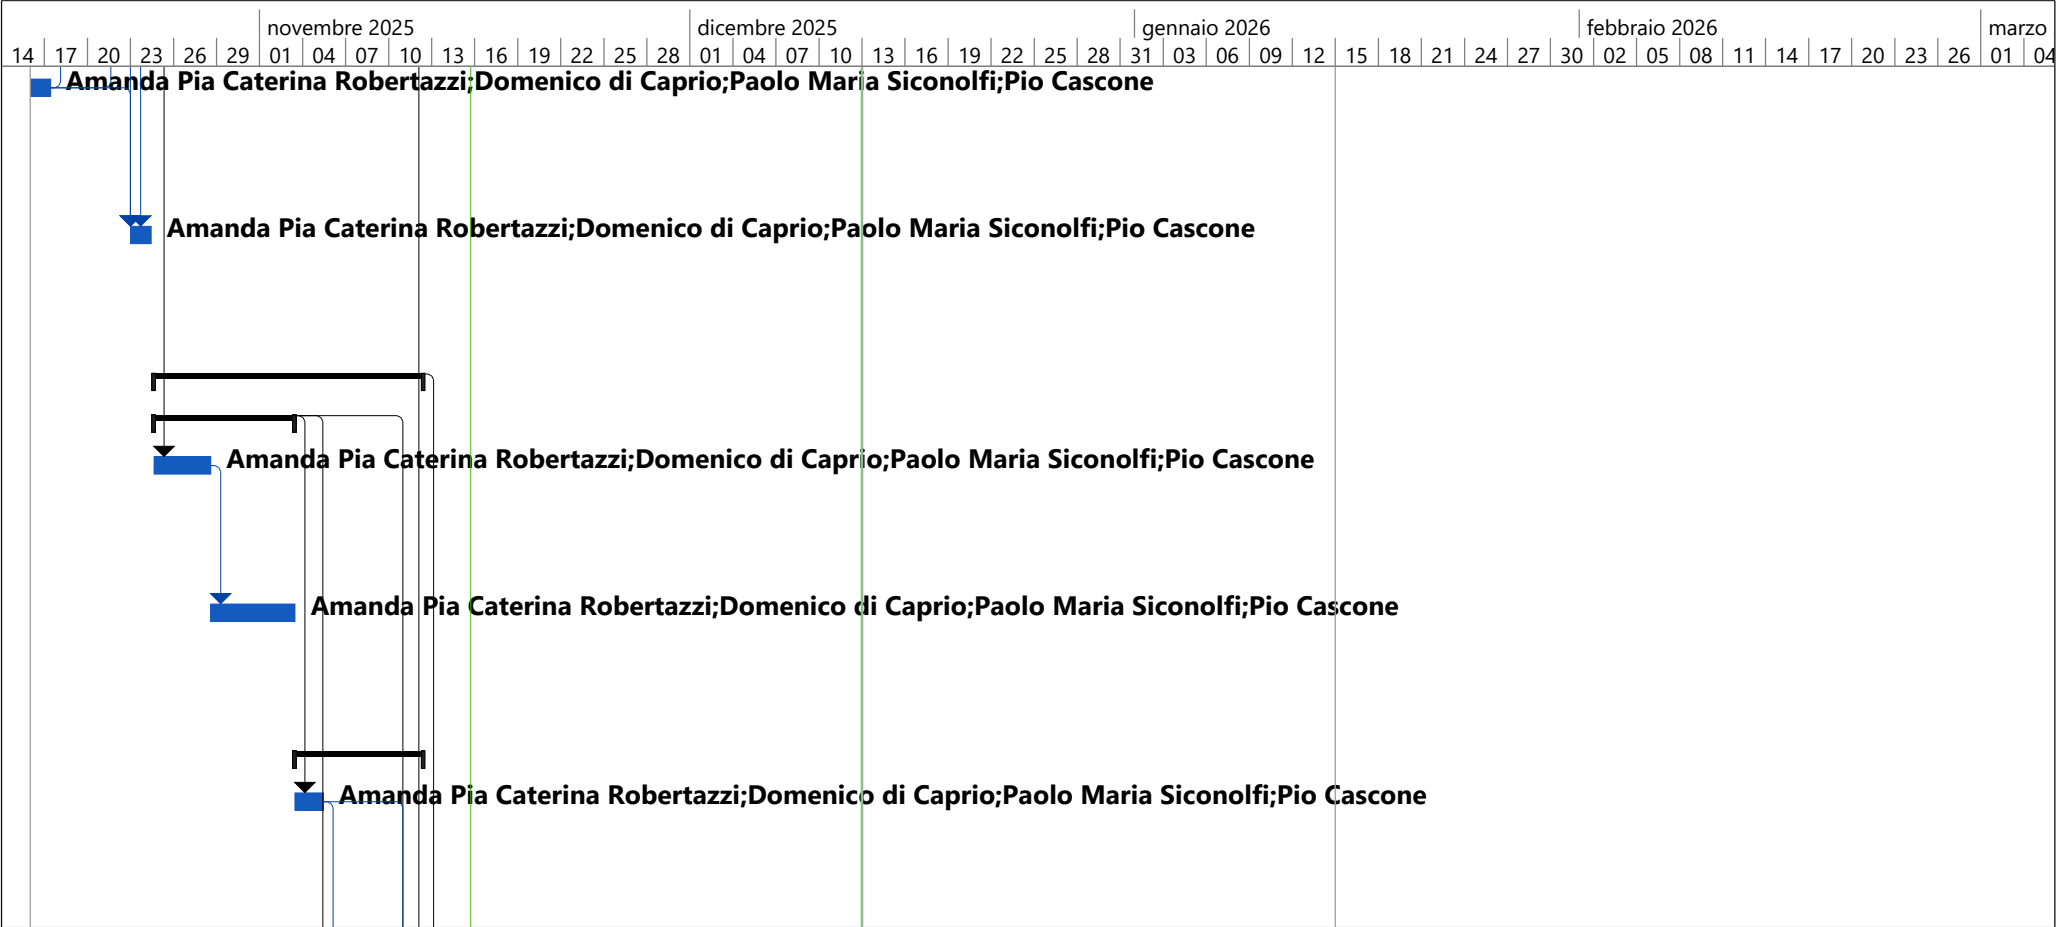


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

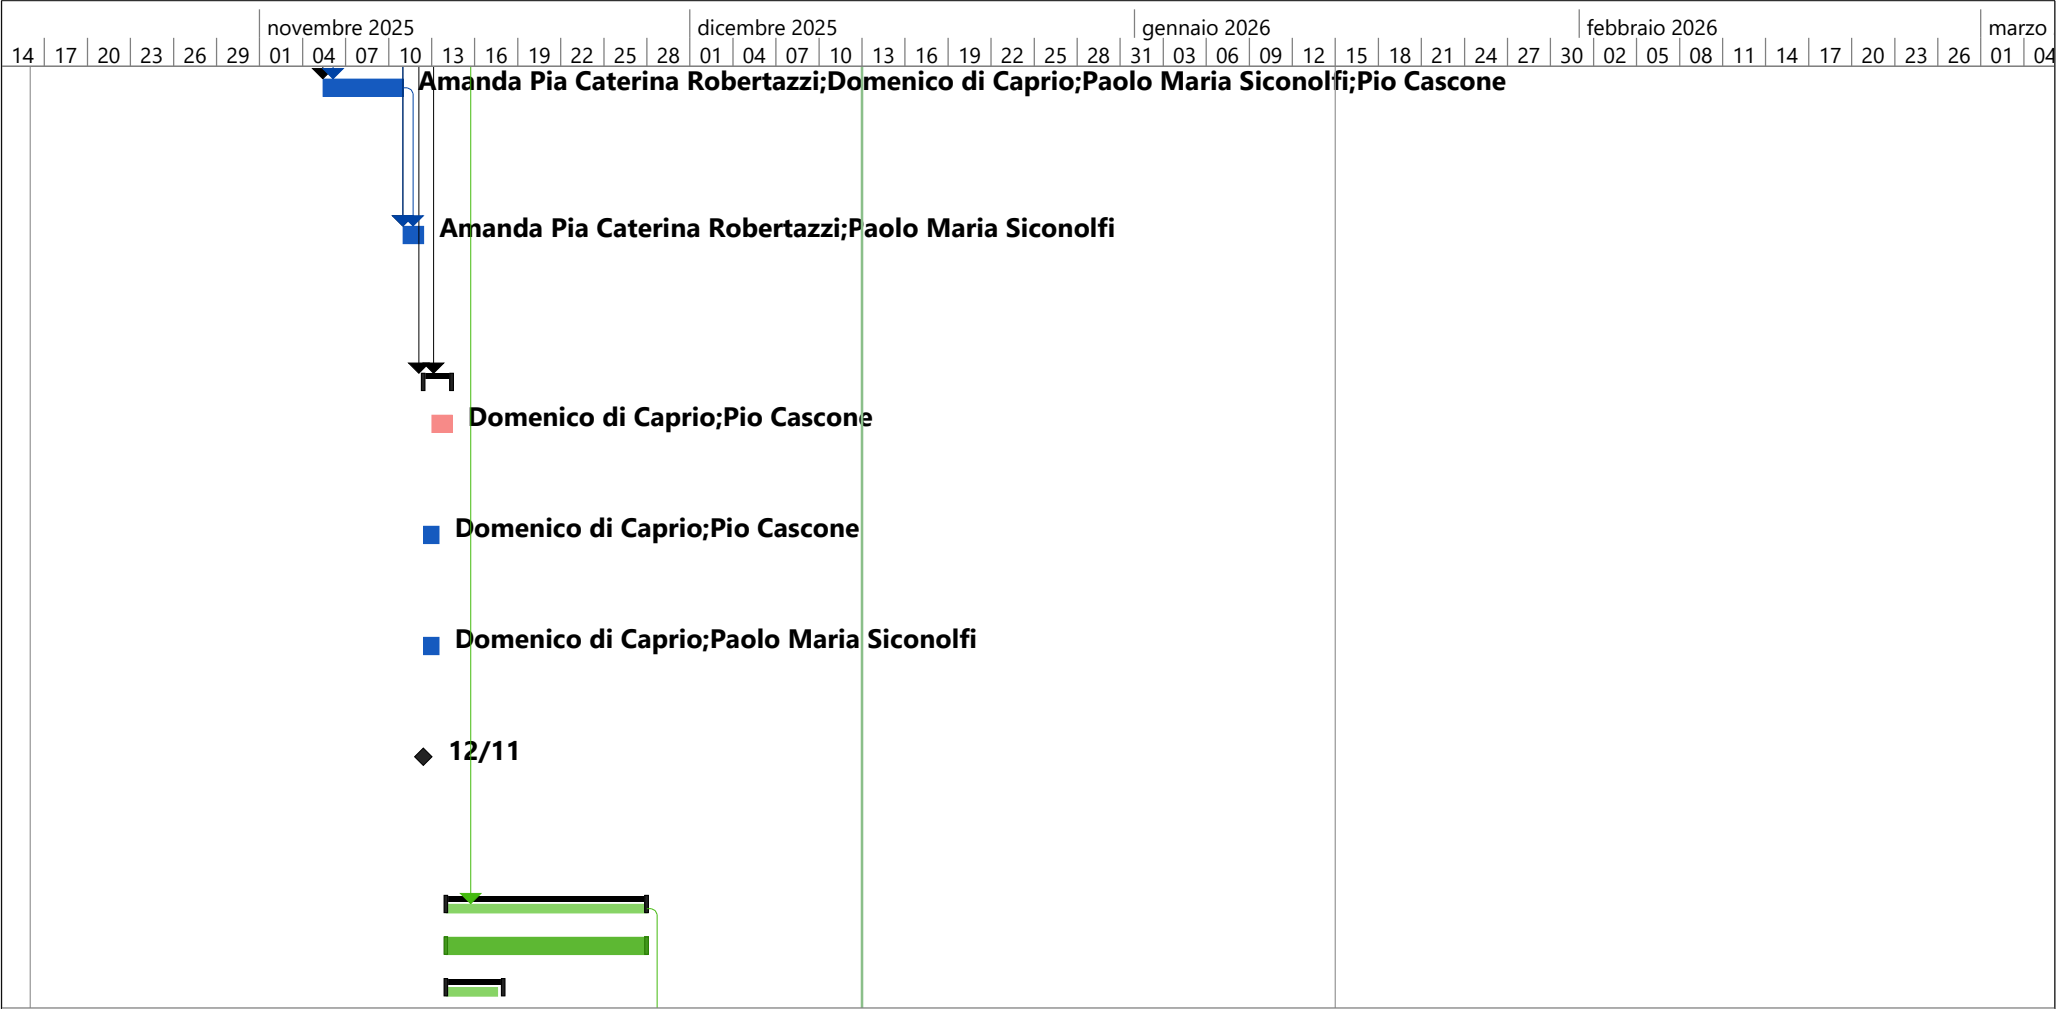


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

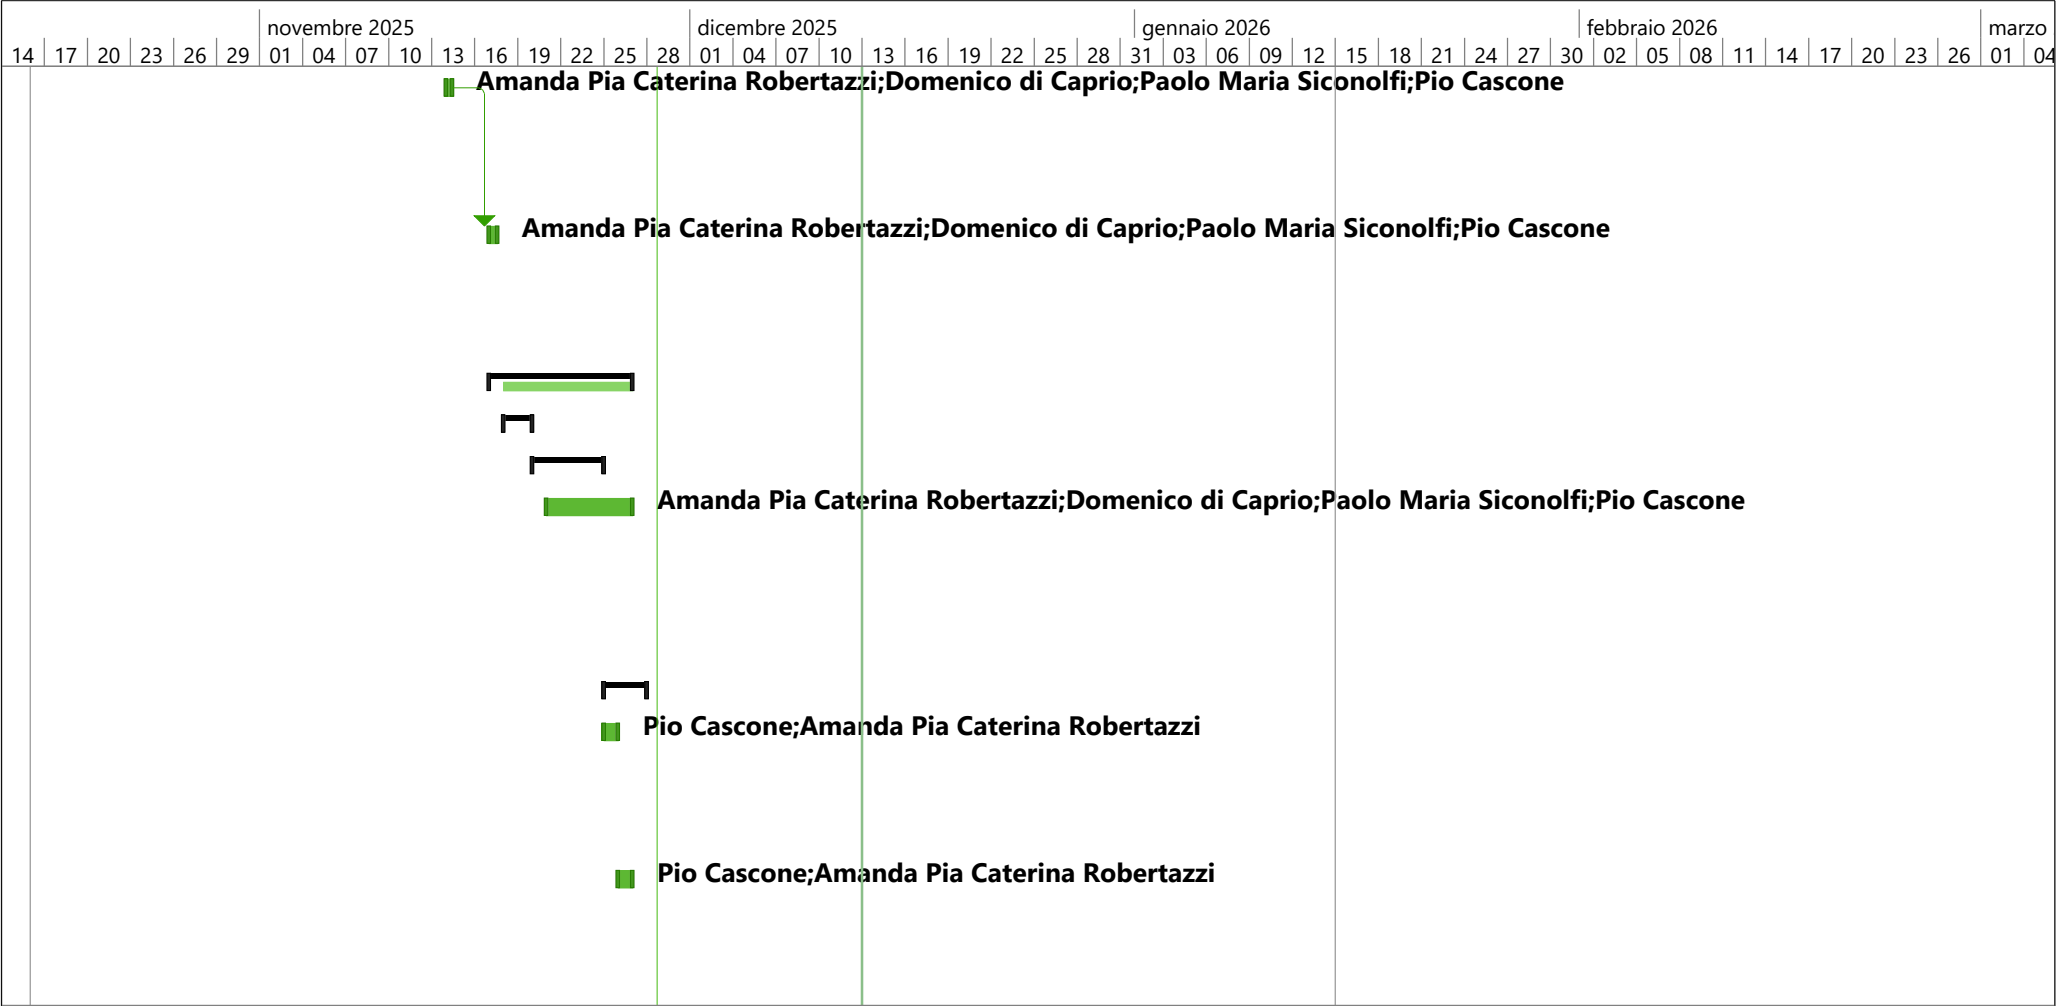


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

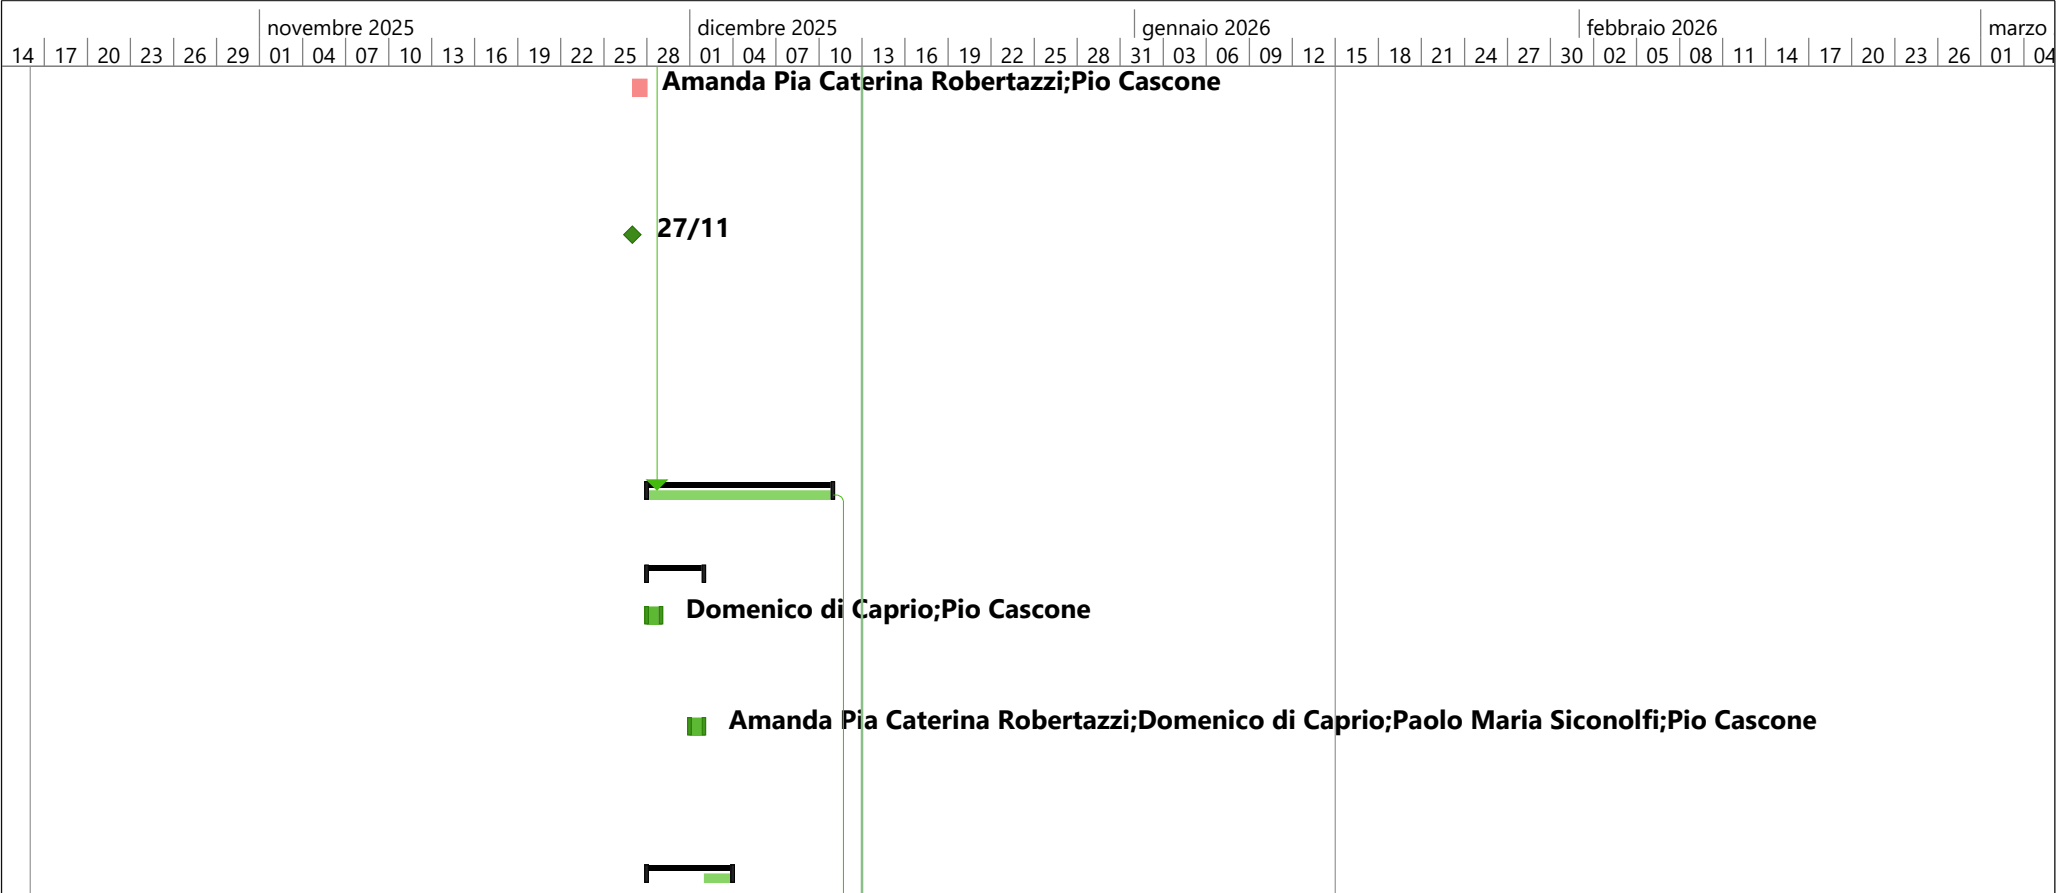


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

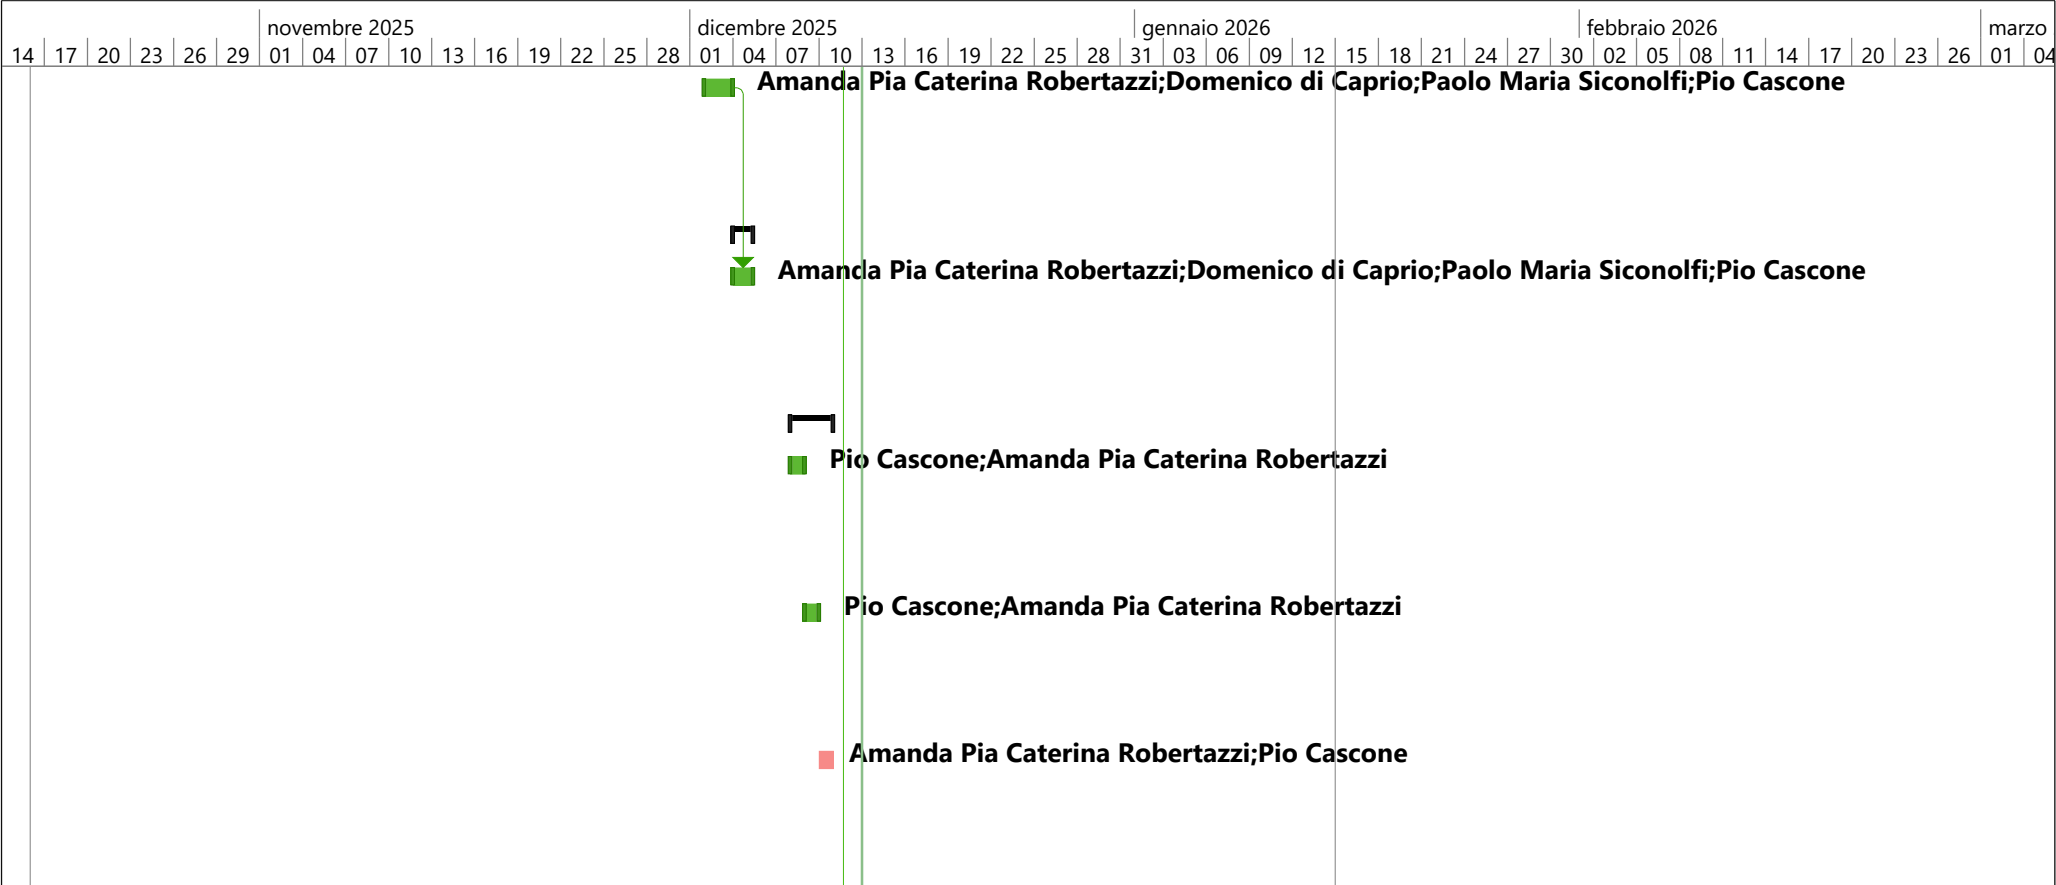


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

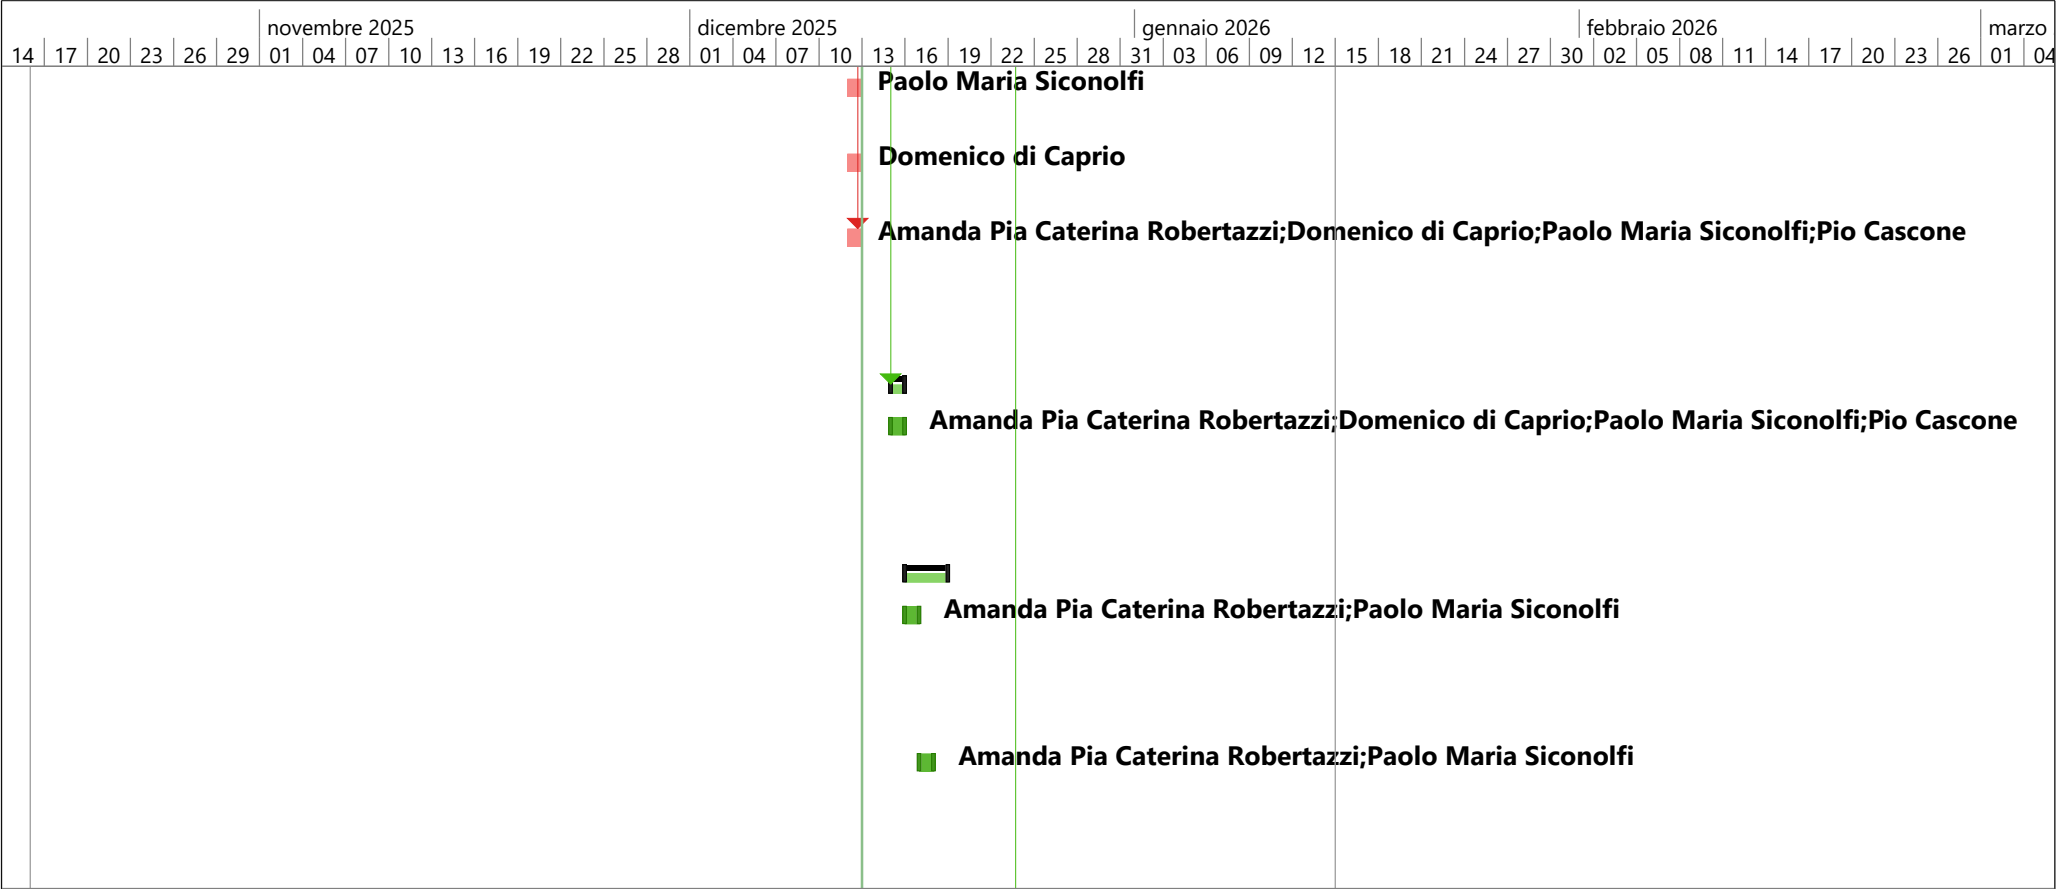


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

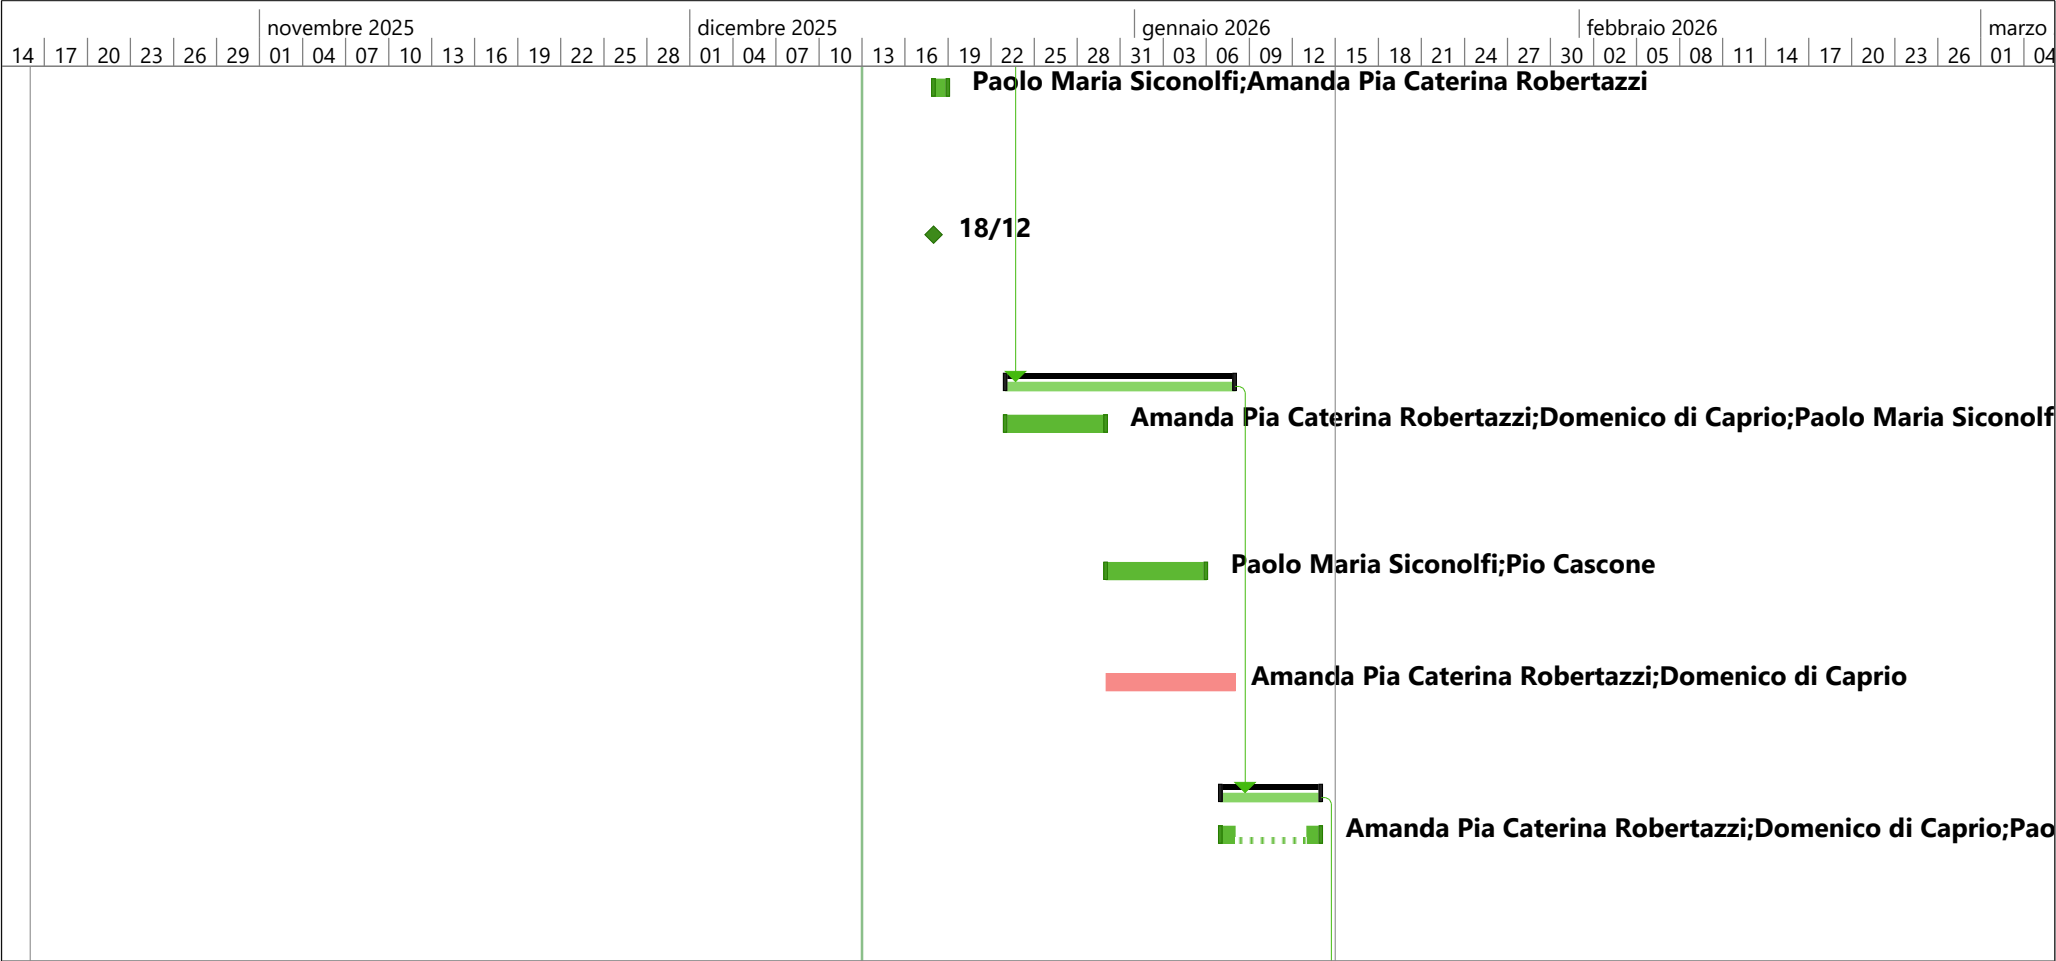


Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

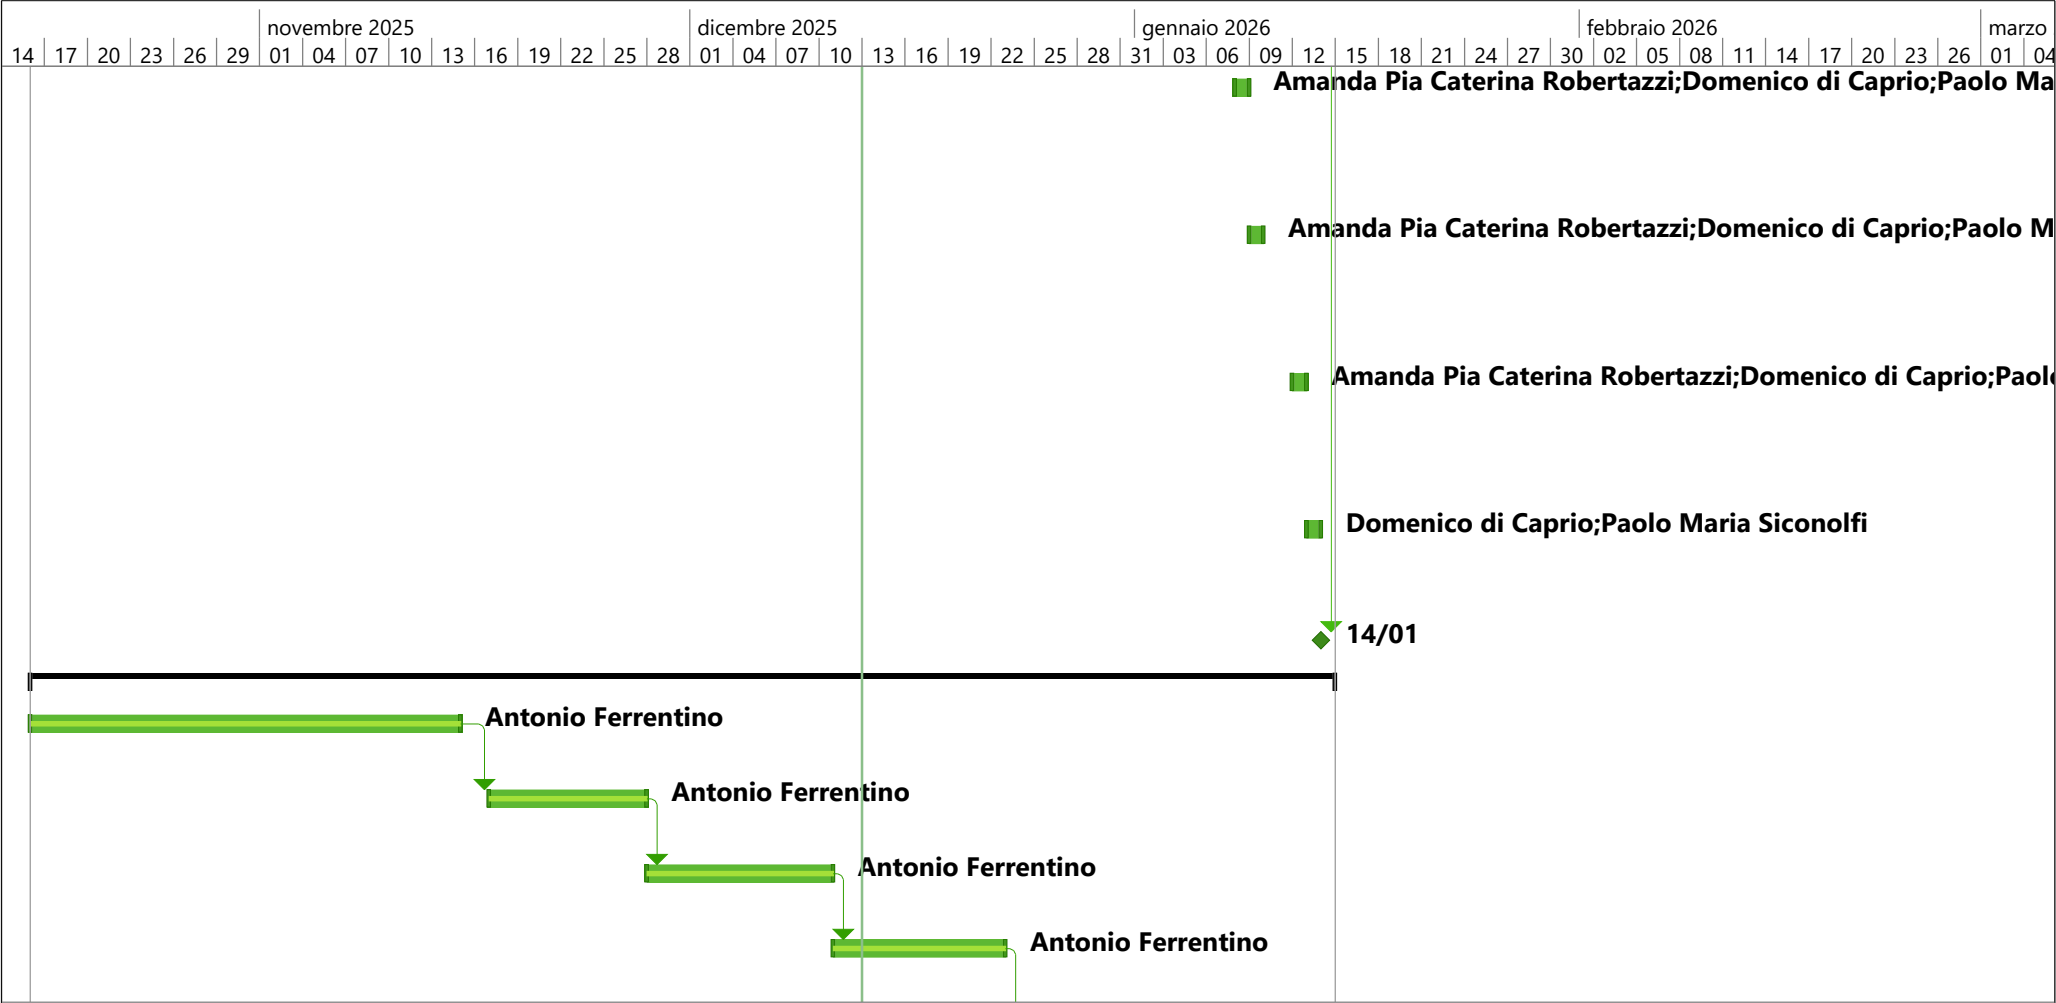

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean Date: sab 13/12/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task



Inactive Summary



External Tasks



Split



Manual Task



External Milestone



Milestone



Duration-only



Deadline



Summary



Manual Summary Rollup



Critical



Project Summary



Manual Summary



Critical Split



Inactive Task



Start-only



Progress



Inactive Milestone



Finish-only



Manual Progress



Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean Date: sab 13/12/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

nolfi;Pio Cascone

Paolo Maria Siconolfi;Pio Cascone

Project: CityClean Date: sab 13/12/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Maria Siconolfi;Pio Cascone

o Maria Siconolfi;Pio Cascone

aolo Maria Siconolfi;Pio Cascone

Project: CityClean Date: sab 13/12/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

Project: CityClean
Date: sab 13/12/25

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	
