



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba



Time Management

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.0
Data	12/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
12/12/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Task List	4
2 Network Diagram	5
2.1 Analisi	6
3 GANTT	7
3.1 Analisi	7
4 Resources Load	8



1 Task List


Si riporta di seguito, l'elenco dei task comprensivo di ID, durata, data di avvio, data di chiusura e predecessori.

WBS ▼	Task Name ▼	Durata ▼	Inizio ▼	Fine ▼
0	▸ CityClean	65 giorni	gio 16/10/25	mer 14/01/26
1	▸ RAD	22 giorni	gio 16/10/25	ven 14/11/25
2	▸ SDD	10 giorni	ven 14/11/25	gio 27/11/25
3	▸ ODD	9 giorni	ven 28/11/25	mer 10/12/25
4	▸ TP - TCS	8 giorni	gio 11/12/25	lun 22/12/25
5	▸ Implementazione	12 giorni	mar 23/12/25	mer 07/01/26
6	▸ Testing	5 giorni	mer 07/01/26	mar 13/01/26
7	Consegna	0 giorni	mer 14/01/26	mer 14/01/26
8	▸ ManagementMVP	65 giorni	gio 16/10/25	mer 14/01/26
8.1	Management RAD	22 giorni	gio 16/10/25	ven 14/11/25
8.2	Management SDD	9 giorni	lun 17/11/25	gio 27/11/25
8.3	Management ODD	9 giorni	ven 28/11/25	mer 10/12/25
8.4	Management TP e TCS	8 giorni	gio 11/12/25	lun 22/12/25
8.5	Management Implementazione	12 giorni	mar 23/12/25	mer 07/01/26
8.6	Management Testing	5 giorni	gio 08/01/26	mer 14/01/26



2 Network Diagram

Di seguito si riporta il network diagram del progetto.

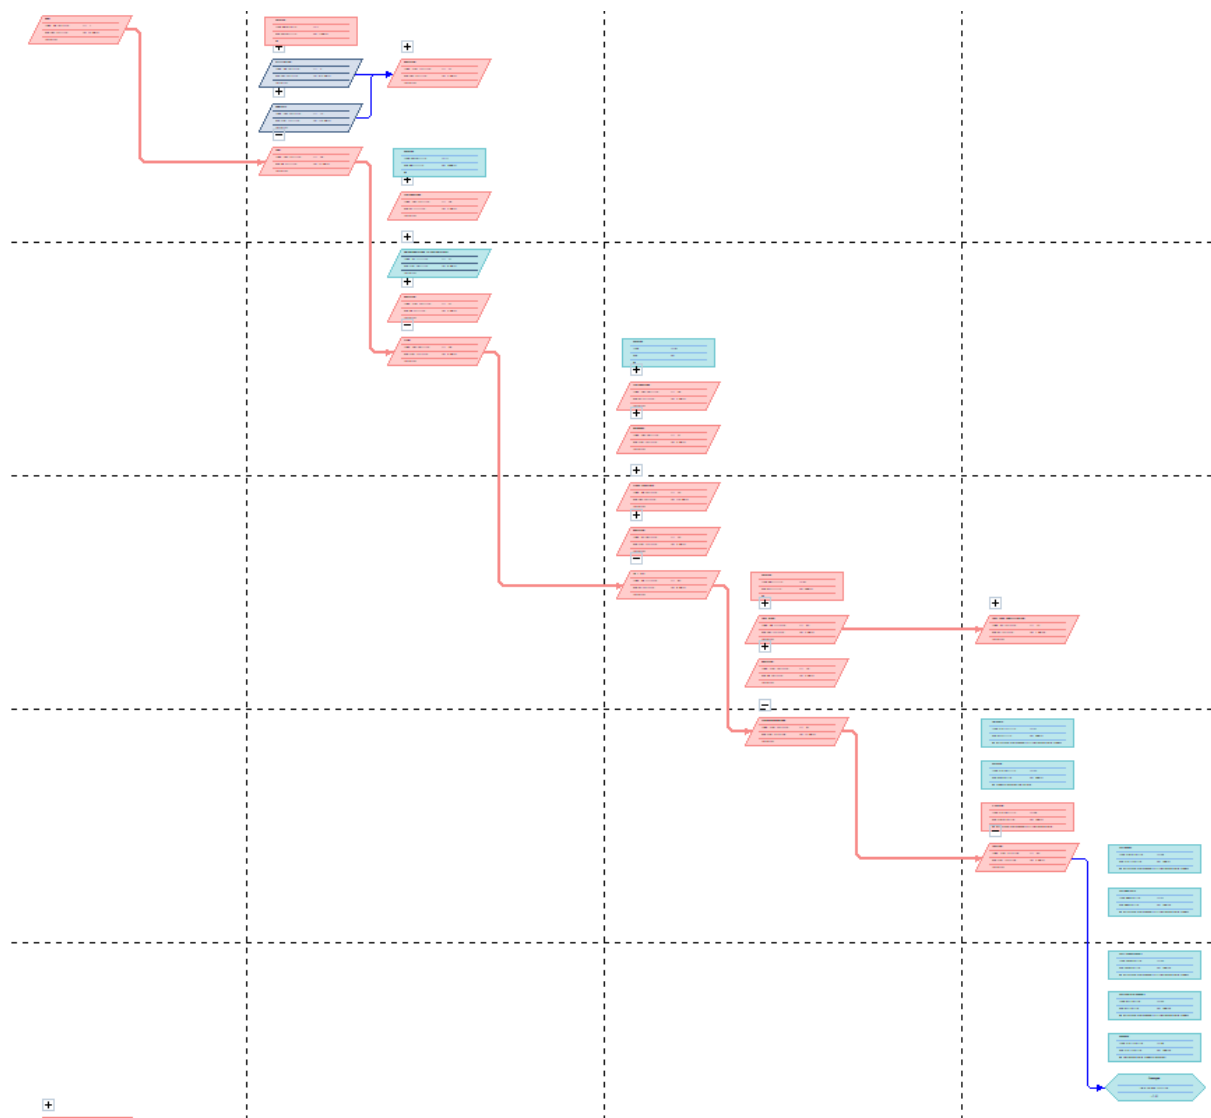




2.1 Analisi

In rosso possiamo notare le attività del percorso critico. Il project manager ha il compito di monitorare costantemente queste attività, allocando le risorse in modo efficace e assicurando che ogni fase sia completata entro i tempi previsti. È essenziale che il project manager mantenga una comunicazione chiara e costante con il team di progetto e gli stakeholder, per identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi che potrebbero causare ritardi. Inoltre, il project manager deve essere proattivo nella gestione dei rischi, identificando potenziali minacce al percorso critico e sviluppando piani di mitigazione per prevenire o ridurre l'impatto di questi rischi sul progetto. Per questo motivo, sono stati pianificati buffer temporali, e verranno revisionate le priorità delle attività durante il progetto, adattando le strategie della gestione delle risorse in base all'evoluzione del progetto stesso.



3 GANTT

Il diagramma che segue illustra il GANTT del progetto:

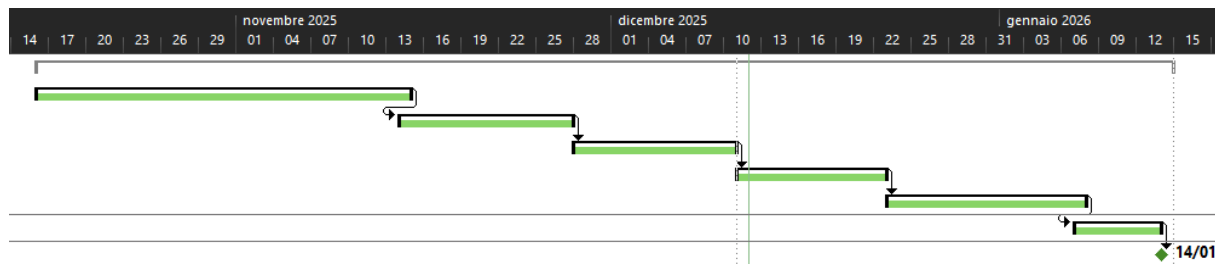

3.1 Analisi

Osservando il Gantt si colgono: la timeline globale del progetto, i blocchi principali (RAD, SDD, e successivi), la suddivisione dettagliata delle attività e il fatto che il progetto prosegue su più mesi con una struttura ripetitiva di analisi, progettazione, implementazione e test. Si vede anche che il controllo qualità è integrato (revisioni e matrici di tracciabilità) e che il lavoro è fortemente collaborativo, con molte attività condivise da più risorse, elemento importante per valutare rischi di ritardi e necessità di gestione del carico di lavoro.



4 Resources Load

Il diagramma che segue, mostra la distribuzione del lavoro per lo sviluppo e il management del progetto. L'asse orizzontale illustra le WBS di primo livello in corrispondenza delle quali le barre colorate mostrano il carico di lavoro per il team e il PM.

